

监督备案号: 2019046

房屋建筑和市政基础设施工程 施工安全监督

申 报 表

工程名称: 泗县农机农资物流园设计施工一体化

申报单位: (盖章)

申报日期: 2019年5月12日

泗县住房和城乡建设委员会制

申报说明



扫描全能王 创建

申报说明

- 1、建设单位到安监机构领取本表，按要求填报。
- 2、办理安全监督时，所提交的申报资料须装订成册。
- 3、安监机构审查建设单位提供的安全监督资料，符合条件的5日内办理完监督手续；资料不全或不符合条件的，自收到资料之日起5日内退回资料并说明理由。
- 4、安监机构办理工程安全监督手续后5日内发出《房屋和市政基础设施工程安全监督通知书》。
- 5、工程类型：建筑、装饰装修、安装、市政基础设施和其他工程。
- 6、工程项目部、监理部人员的配备按照安徽省住房城乡建设厅《关于进一步明确建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责的通知》（建市〔2014〕186号）文件要求填写。
- 7、建设单位、监理单位、施工单位对报送的安全监督资料的真实性、有效性及具备安全监督条件签署意见并加盖单位公章。
- 8、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督申报表》一式四份，安监机构、建设单位、监理单位、施工单位各一份。



1-1 建筑工程安全监督申请书

泗县安全股（安监机构）：

今有我单位 泗县农机农资物流园设计施工一体化工程，按照《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程施工许可管理办法》、《房屋和市政基础设施工程施工安全安全监督规定》、《房屋和市政基础设施工程施工安全安全监督工作规程》等相关规定，现携下列材料到你处办理施工安全监督手续。

序号	申报资料	证书（合同）号
1	建设工程开工安全生产条件审查表	符合要求
2	施工中标通知书、施工合同、企业安全生产许可证	符合要求
3	项目经理、专职安全生产管理人员等安全生产知识考核合格证书	符合要求
4	施工现场安全管理网络及安全技术措施	符合要求
5	施工现场平面布置图	符合要求
6	施工现场周边环境和地下设施情况交底表	符合要求
7	危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施	符合要求
8	施工扬尘污染防治措施	符合要求
9	工程项目安全生产事故应急救援预案	符合要求
10	保险缴纳凭证	符合要求
11	安全文明施工措施费支付计划或凭证	符合要求
12	其他规定需要的文件	符合要求

联系人：高丽丽

建设单位（盖章）：

联系电话：18919980073

年 月 日



1-2 工程概况及建设各方责任主体基本情况

工程概况	工程名称	泗县农机农资物流园设计施工一体化			工程地点	彩虹大道北侧	
	工程类型	框架结构			结构/层次	高层/多层	
	建筑面积	117505.90 m ²			工程造价	暂估200000000元	
	开竣工日期				安全文明施工目标	市标化工地	
建设单位	名称	泗县城市建设投资有限公司			地址	泗县桃花源北区	
	法定代表人	吴杰	电话	18005570200	组织机构代码证	913413247529760224	
	项目负责人	高邵伟	电话	18949980073	现场负责人(电话)	18949980073	
监理单位	名称	安徽峙恒工程管理有限公司			法定代表人	潘峰	
	资质等级	甲级			资质证书号	E134004544-4/1	
	项目总监	李仁群	电话		资格证书号	34001984	
	总监代表	刘康			资格证书号	32022057	
	监理工程师	刘勇			资格证书号	32010972	
	监理工程师	王成学			资格证书号	皖 JL140006	
	监理工程师	李东昌			资格证书号	皖监员201711316	
	监理员				资格证书号		
	监理员				资格证书号		
施工总承包	名称	中国五冶集团有限公司			法定代表人	程并强	
	资质等级及证书号	特级资质、证书编号 D251461562			安全生产许可证编号	(川) JZ 安许证字 (2004) 000111	
	企业分管安全负责人	何彬	电话	15961835391	安全考核证号	川建安C(2008)0006279	
	项目经理	徐斌	电话	13621932726	资格证书号	川151050804369	
					安全考核证号	川建安B(2005)0002647	
	技术负责人	石永高	电话	15021099451	资格证书号		



	安全员	彭学生		安全考核证号	川建安 C(2008)9002159
	安全员	钟昌洪		安全考核证号	川建安 C(2008)0090538
	安全员	叶青松		安全考核证号	沪建安 C(2919)1187442
	安全员			安全考核证号	
专业承包单位	名称	无		法定代表人	
	资质等级及证书号			安全生产许可证编号	
	企业分管安全负责人			安全考核证号	
	项目经理		电话		安全考核证号
	安全员			安全考核证号	
	安全员			安全考核证号	
劳务分包单位	名称	无		法定代表人	
	资质等级及证书号			安全生产许可证编号	
	企业分管安全负责人			安全考核证号	
	项目经理			安全考核证号	
	安全员			安全考核证号	
	安全员			安全考核证号	
拟进场的大型机械设备情况:					
序号	设备名称	规格型号		数量	
1	塔式起重机	QTZ63		1	
2	塔式起重机	QTZ40		2	
3					
4					
5					
6					



施工 单位 意见	同意申报  (盖章) 年 月 日
监理 单位 意见	同意申报  (盖章) 年 月 日
建设 单位 意见	我单位承诺所报送的工程安全监督申报资料真实有效。  (盖章) 年 月 日
窗口 意见	材料齐全，同意受理，请安全股 3 日内反馈现场踏勘及监督意见。 窗口人员：朱经经 2017年 8月 9日
安全 监督 机构 意见	负责人：  (盖章) 年 月 日



1-3 建设工程开工安全生产条件审查表

工程名称：泗县农机农资物流园设计 建设单位：泗县城市建设投资有限公司

施工一体化工程：

施工单位：中国五冶集团有限公司 项目经理：徐斌

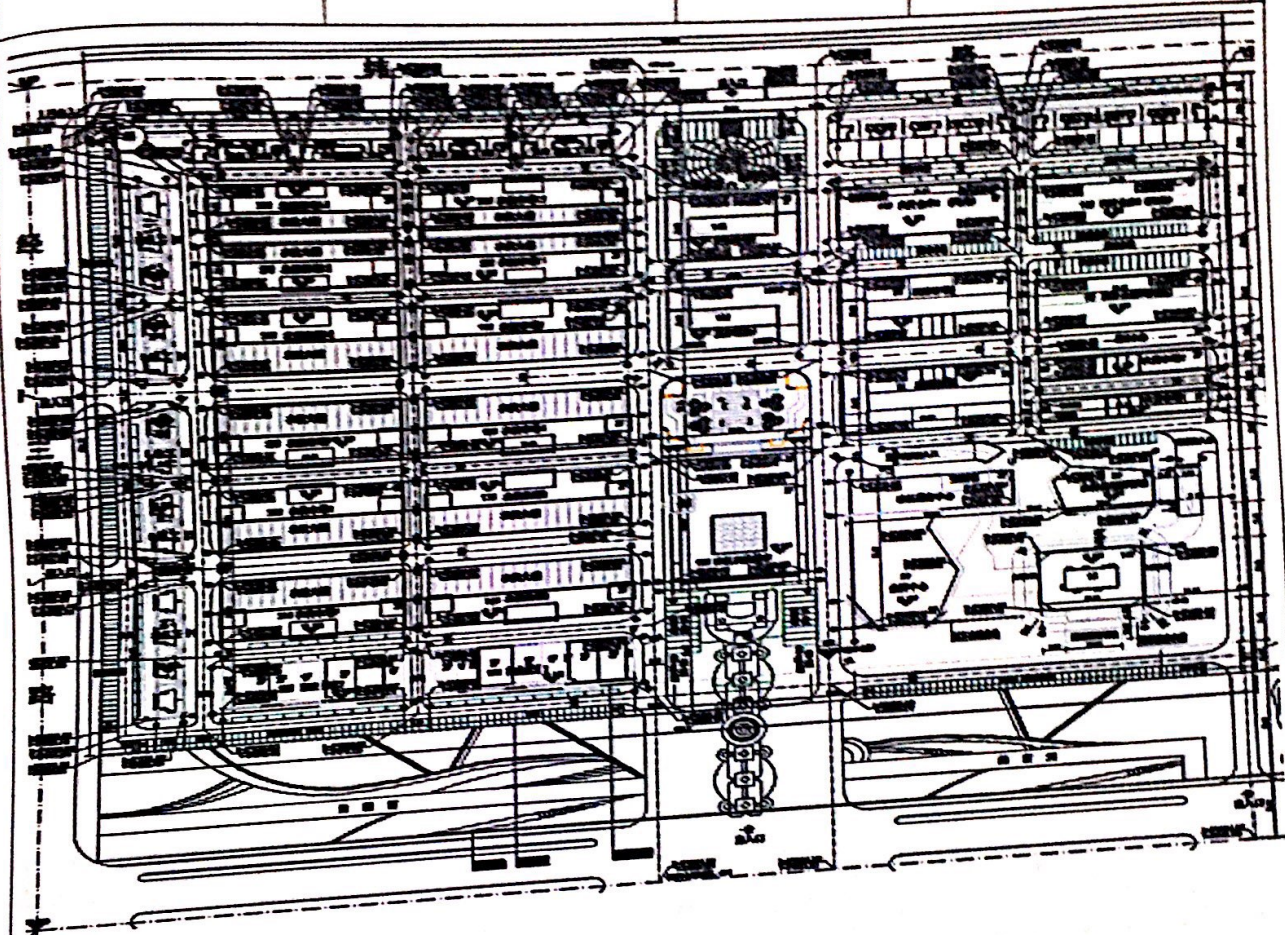
监理单位：安徽峙恒工程管理有限公司 项目总监：刘康


序号	审查内容	审查意见
1	施工单位是否持有安全生产许可证	
2	项目安全生产责任体系建立情况。是否按规定建立了安全生产管理机构，并按规定配备专职安全生产管理人员，项目负责人、专职安全生产管理人员是否取得安全生产考核合格证书，并在有效期内。	符合要求
3	施工现场安全生产管理制度建立情况	符合要求
4	安全文明施工措施费是否有支付计划或凭证	符合要求
5	是否已按规定签订安全生产协议书	符合要求
6	是否按规定编制了施工组织设计，专项方案是否有计划	符合要求
7	施工扬尘污染防治措施落实情况	符合要求
8	拟进入施工现场的机械设备情况及布置方案	符合要求
9	施工现场“三通一平”、“施工标牌”等设置情况	符合要求
10	施工现场围挡、大门、道路、临时设施等是否符合规定要求	符合要求
11	是否针对性地制定了工程项目安全生产事故应急救援预案	符合要求
12	其它事项	无
审查结论： 徐斌签字		
总监理工程师签字： 李仁群		项目负责人： 高田



1-4 施工现场平面布置图

建设单位项目负责人	高邵伟	总监理工程师	刘康
施工单位技术负责人	顾卫星	项目经理	徐斌



项目经理签字: 
 施工单位(章)
 年 月 日



总监理工程师签字: 
 监理单位(章)
 年 月 日

项目负责人签字: 
 建设单位(章)
 年 月 日

施工现场平面布置图应符合“边界清晰、围护美观、场内平实、物料整齐、文明有序”的总体要求,应详细标明办公区、施工区、生活区。



1-5 施工现场周边环境及地下设施情况交底表

工程名称		泗县农机农资物流园设计施工一体化项目	
建设单位负责人	高邵伟	总监理工程师	刘康
施工单位技术负责人	顾卫星	项目经理	徐斌
序号	交底项目	交底情况	
1	地上管线, 如毗邻高压线、网线的状况	已交底	
2	施工对毗邻建筑物、构筑物、地下工程的影响	已交底	
3	深基坑施工对周边环境的影响	已交底	
4	施工对周边通信、道路等公用设施的影响	已交底	
5	施工现场的临建设施选址是否合理, 结构是否安全, 围挡是否按标准设置	已交底	
6	施工现场对周边交通、行人、集贸市场和学校等人流密集区域的影响	已交底	
7	施工中各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动对环境的污染和危害	已交底	
8	拟使用起重机械设备对周边环境的影响	已交底	
9	施工现场及毗邻区域内地下管线资料、气象水文观测资料	已交底	
10	其它可能造成严重后果的危险源	已交底	
交底方负责人签字:  建设单位(章) 年 月 日		见证方负责人签字:  监理单位(章) 年 月 日	
		接收方负责人签字:  施工单位(章) 年 月 日	

说明: 图纸及其他说明资料等可另附页



扫描全能王 创建

1-6 危险性较大的分部分项工程清单


工程名称	泗县农机农资物流园设计施工一体化项目	结构层次	14 层
施工单位	五冶集团有限公司	项目经理	徐斌
监理单位	安徽峙恒工程管理有限公司	总监理工程师	刘康
分部分项工程	内 容	预计实施时间	
一、基坑支护、降水工程	☐ 开挖深度超过 3m (含 3m) 的基坑(槽)支护、降水工程 ☐ 虽未超过 3m 但地质条件和周围环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程	2019.6	
二、土方开挖工程	☐ 土方开挖深度超过 3m (含 3m) 的基坑(槽)的土方开挖工程	2019.6	
三、模板工程及支撑体系	☐ 各类工具式模板工程：包括滑模、爬模、大模板、飞模等工程 ☐ 混凝土模板支撑工程：搭设高度 5m 及以上；搭设跨度 10m 及以上；施工总荷载 10KN/m ² 及以上；集中线荷载 15KN/m ² 及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 ☐ 承重支撑系统：用于钢结构安装等满堂支撑体系	2019.7	
四、起重吊装安装拆卸工程	☐ 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 10KN 及以上的起重吊装工程 ☐ 采用起重机械进行安装的工程 ☐ 起重机械设备的安装、拆卸	2019.9	
五、脚手架工程	☐ 搭设高度在 24m 及以上的落地式钢管脚手架工程 ☐ 附着整体和分片提升脚手架工程 ☐ 悬挑脚手架工程 ☐ 吊篮脚手架工程 ☐ 自制卸料平台、移动操作平台工程 ☐ 新型及异型脚手架工程	2019.8	
六、拆除、爆破工程	☐ 建筑物、构筑物拆除工程	无	



七、其 他	☐ 采用爆破拆除工程	
	☐ 建筑幕墙安装工程	
	☐ 钢结构、网架、索模结构安装工程	
	☐ 人工挖孔桩工程	
	☐ 地下暗挖、顶管及水下作业工程	
	☐ 预应力工程	
	☐ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程	

安全管理措施（可另附页）：

- 1、人员进场安全教育、安全培训考试合格后才允许进入项目部工地施工作业，每周项目经理带队、项目施工主管、技术负责人一起对现场、临时用电、脚手架、临边防护、机械设备、塔吊等进行安全检查发现隐患下达整改单限期整改完成
- 2、超过一定规模的模板支撑、脚手架、深基坑、塔吊、临时用电等编制专项施工方案并进行方案交底、施工作业前进行安全技术交底，对脚手架、塔吊等执行验收制，度危险性较大的分部分项工程进行安全旁站制度
- 3、机械设备、安全防护加强对机械设备的管理，做到三定制度、定人管理、定人操作、定期维护，特种设备安装前到安监站办理告知、安装完后经第三方检测合格后挂牌才允许使用。
- 4、施工用电、按安全规范要求 TN-S 三项五线制，严格执行一闸一机一漏电装置、一起电气设备保修有良好的接地装置，使用小型手持电动工具均使用带漏电保护箱

 项目经理（签字）： 施工单位（盖章）： 年 月 日	总监理工程师（签字）：  监理单位（盖章）： 年 月 日	项目负责人（签字）：  建设单位（盖章）： 年 月 日
填写说明	本项目工程所含的危险性较大的分部分项工程，应在以上栏目所列的相应分部分项工程前的“□”内打上“√”，没有的应在“□”内打“×”	



1-7 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单

工程名称	泗县农机农资物流园设计施工一体化项目	结构层次	14 层
施工单位	五冶集团有限公司	项目经理	徐斌
监理单位	安徽峙恒工程管理有限公司	总监理工程师	刘康
分部分项工程	内容	预计实施时间	
一、深 基 坑 工 程	☐ 开挖深度超过 5m (含 5m) 的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程 ☒ 开挖深度虽未超过 5m, 但地质条件、周围环境和地下管线复杂, 或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程	2019.6	
二、模 板 工 程 及 支 撑 体 系	☐ 工具式模板工程: 包括滑模、爬模、飞模工程 ☐ 混凝土模板支撑工程: 搭设高度 8m 及以上; 搭设跨度 18m 及以上, 施工总荷载 15KN/m ² 及以上, 集中线荷载 20KN/m 及以上 ☐ 承重支撑系统: 用于钢结构安装等满堂支撑体系, 承受单点集中荷载 700kg 以上	2019.8	
三、起重吊装 安装拆卸 工程	☐ 采用非常规起重设备、方法, 且单件起吊重量在 100KN 以上的起重吊装工程 ☐ 起重量 300KN 及以上的起重设备安装工程、安装高度 200m 及以上内爬起重设备的拆除工程	无	
四、脚手架 工 程	☐ 搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程 ☐ 提升高度 150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程 ☒ 架体高度 20m 及以上悬挑脚手架工程	2019.7	
五、拆除、爆 破 工 程	☐ 采用爆破拆除工程 ☐ 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气体(液)体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物拆除工程 ☐ 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程 ☐ 文物保护建筑、优秀历史建筑历史文化风貌区控制范围的拆除工程	无	



六、其他

- ☐ 施工高度 50m 及以上的建筑幕墙安装工程
- ☐ 跨度大于 36m 及以上的钢结构安装工程; 跨度大于 60m 及以上的网架和索模结构安装工程
- ☐ 开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程
- ☐ 地下暗挖、顶管及水下作业工程
- ☐ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程

安全管理措施 (可另附页):

人员进场安全教育、安全培训考试合格后才允许进入项目部工地施工作业编制专项施工方案并进行方案交底、施工作业前进行安全技术交底, 对脚手架、塔吊等执行验收制, 度危险性较大的分部分项工程进行安全旁站制度

项目经理 (签字):

施工单位 (盖章)

年 月 日

总监理工程师 (签字):

监理单位 (盖章)

年 月 日

项目负责人 (签字):

建设单位 (盖章)

年 月 日

填写说明

本项目工程所含的危险性较大的分部分项工程, 应在以上栏目所列的相应分部分项工程前的 “□” 内打上 “√”, 没有的应在 “□” 内打 “×”



扫描全能王 创建
